【参考】　各務原市ふれあいバス導入スケジュール

平成27年3月18日
岐阜バスコミュニティ

見出しについて下記の通り、ご報告いたします。
※今後、変更のたびに随時更新します。

ふれあいバス再編に伴う作業	開始日	3月下旬
	完了予定日	10月1日

仮スケジュール
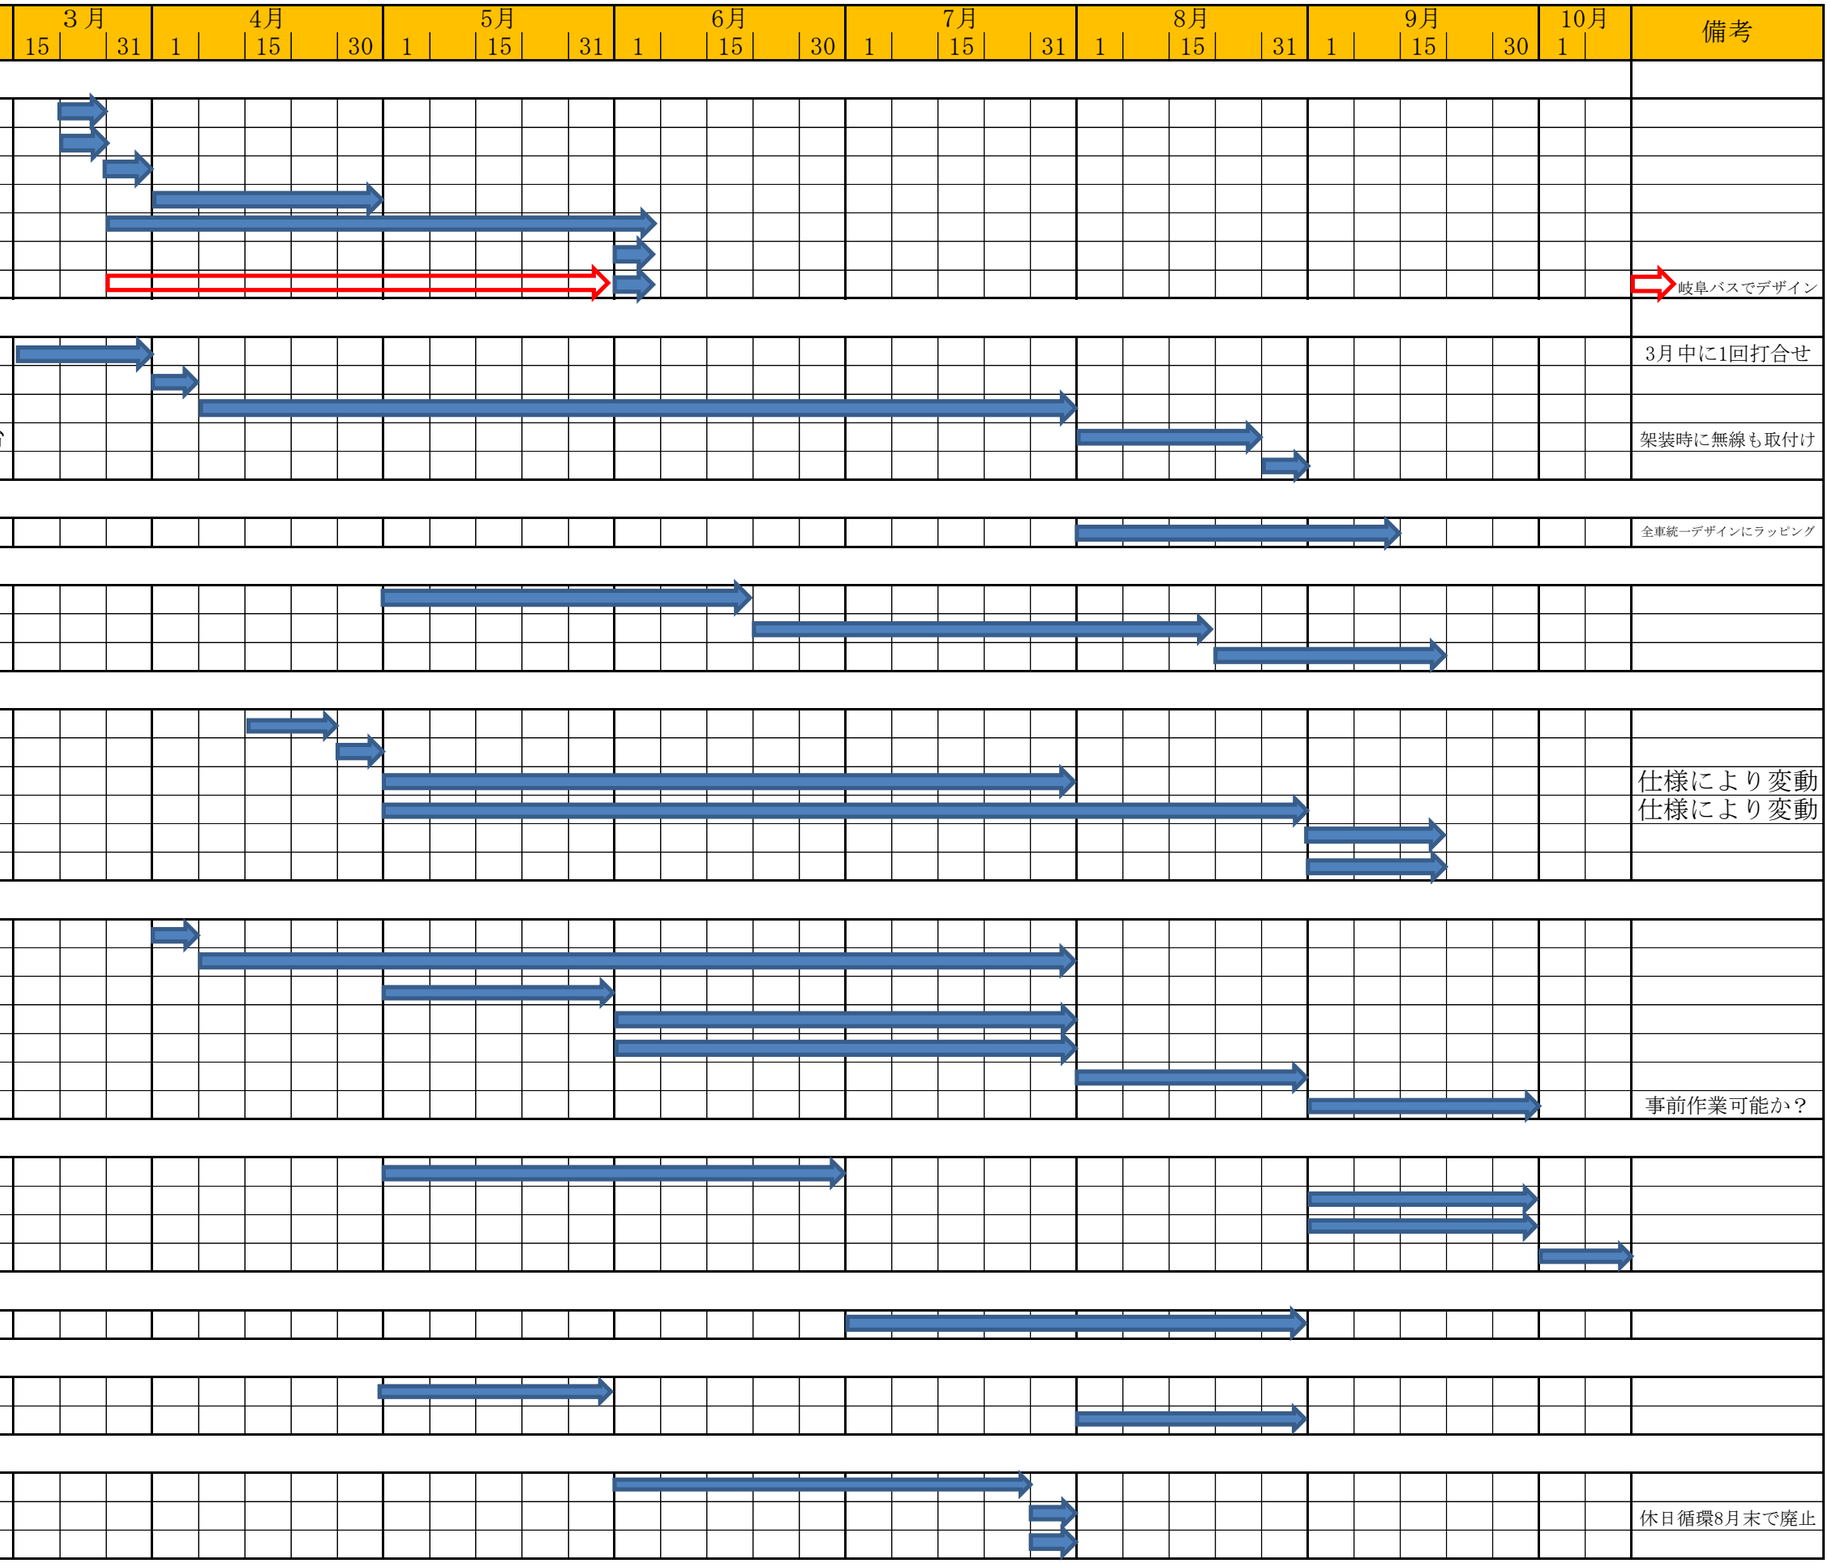
項目	納期	備考
各務原市役所　関係		
1　路線確定（公共交通会議）		
2　割引き運賃制度決定		
3　契約書締結		
4　バス停、購入、変更数確定		
5　運行ダイヤ協議、決定（公共交通会議）		
6　路線廃止（公共交通会議）		
7　バスデザイン決定（公共交通会議）		岐阜バスでデザイン
車両購入、架装		
8　仕様決定		3月中に1回打合せ
9　発注		
10　車両製造期間	4ヶ月	
11　架装、登録作業	1週間/台	架装時に無線も取付け
12　納車		
ラッピング		
13　ラッピング作業	4日/台	全車統一デザインにラッピング
音声合成、表示機、ＬＥＤ作成		
14　データ原稿作成	1.5ヶ月	
15　データ作成	2ヶ月	
16　完成データチェック	1ヶ月	
ＩＣ対応		
17　ＩＣ対応仕様協議		
18　発注		
19　運賃箱プログラム改修発注	3ヶ月	仕様により変動
20　ＩＣ対応改修期間	4ヶ月	仕様により変動
21　動作チェック	2週間	
22　ＩＣデータ登録作業	2週間	
バスロケ、ＱＲ対応		
23　バスロケ発注		
24　バスロケ車載機器製造期間	3ヶ月～	
25　ステッカー必要数調査	1ヶ月	
26　メイエレック、ステッカー作成	2ヶ月	
27　バス停用の板作成	2ヶ月	
28　ＱＲデータ登録作業	1ヶ月	
29　ＱＲコード取付作業	1ヶ月	事前作業可能か？
バス停購入、変更、設置、廃棄		
30　バス停作成期間	2ヶ月	
31　既存バス停変更作業		
32　新設バス停設置作業		
33　廃止バス停廃棄		
乗務員への教習		
34　教習	2ヶ月	
ダイヤ改正準備		
35　運行ダイヤチェック	1ヶ月	
36　バス停時刻表作成	1ヶ月	
岐阜運輸支局への路線の申請		
37　申請準備	1ヶ月	
38　休日循環線の廃止届出期限	7月31日	休日循環8月末で廃止
39　路線再編、廃止届出期限	7月31日
