



# 各務原市スポーツ施設個別施設計画

令和3年3月  
(令和8年1月改訂)  
各務原市  
(スポーツ課)

## 目次

- 1 個別施設計画の背景・目的等
  - (1)背景と目的
  - (2)個別施設計画の位置付け
  - (3)計画期間
- 2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け
  - (1)今後の方針
  - (2)改修等の優先順位付け
  - (3)目標使用年数
- 3 個別施設計画推進に向けた取組み
- 4 施設の現況
- 5 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

## 1 個別施設計画の背景・目的等


### (1)背景と目的

本市では、高度経済成長期以降の人口増加や行政需要の拡大を背景に、昭和40年代半ばから昭和60年代にかけ、様々な公共建築物やインフラ資産が集中的に整備されてきました。今後は急速に人口減少や高齢化が進行するだけでなく、これらの公共施設等の老朽化も進み、これから一斉に大規模改修や更新の時期を迎えることになります。

このような背景のもと、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を行うため、所有施設等の現状や施設全体の管理に関する基本的な方針を定め、中期的な取組の方向性を明らかにするとともに、市民の安全・安心を確保し、維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平準化を図るための計画として、平成28年度に「各務原市公共施設等総合管理計画」を策定しました。この総合管理計画を着実に推進するために、各施設の特性や維持管理・更新等に係る取組状況を踏まえ、具体的な対応方針を定める本計画を策定しました。

### (2)個別施設計画の位置付け

個別施設計画は、「各務原市公共施設等総合管理計画」の下位計画として位置づけられ、総合管理計画に記載された施設の具体的な計画となります。また、総合管理計画は市の最上位の計画である「各務原市総合計画」の下位計画として位置づけられています。

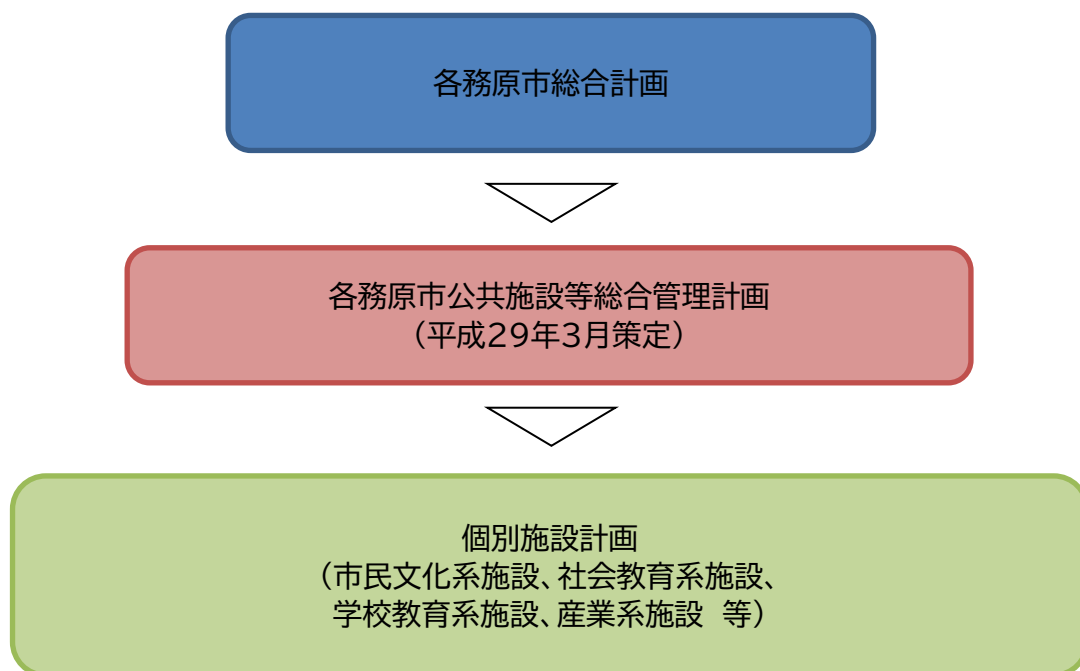

### (3)計画期間

社会情勢の変化や政策動向等によって、公共施設を取り巻く環境や施設の経年劣化、疲労等の状態が時々刻々と変化するため、計画期間は10年間としますが、点検結果その他の状況を踏まえ、適宜計画を見直します。また、施設を維持していくためには、より長期的な視点が不可欠であるため、40年間の費用を算出しています。

## 2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け

### (1) 今後の方針

公共施設管理総合計画の施設類別に応じた基本方針を示しており、本計画においてもその考え方に基づき、今後の施設運営を図っていきます。(公共施設等総合管理計画P35～P42参照)

施設の更新の際には、機能転換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等の必要な対策について今後、積極的に検討していく必要があります。

### (2) 改修等の優先順位付け

施設の実態を踏まえ、施設利用者の安全確保を最優先とし、施設の劣化・損傷が著しい施設から優先的に改修、更新していきます。

### (3) 目標使用年数

施設の目標使用年数は、「建築物の耐久計画に関する考え方」(日本建築学会)を参考にして、以下のように設定します(表1、2参照)。

#### ○鉄筋コンクリート造・・・65年

鉄筋コンクリート造の施設は、その時々地域の状況や他の施設の整備状況等によって、施設機能の見直しや存廃の判断が必要になる可能性が比較的高い施設であるため、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の中間値を採用し、65年とします。

#### ○鉄骨造・・・50年

鉄骨造の施設は、施設の延命工事が容易でなく延命ができない、あるいは延命工事をしたとしても、長期の延命は望めない可能性もあるため、早めに更新を行うことを視野に入れ、「建築物の耐久計画に関する考え方」における目標耐用年数の範囲の最小値を採用し、50年とします。

ただし、目標使用年数に関わらず、日常の点検結果や老朽化の進行状況等を踏まえ、必要に応じて躯体調査を実施するなどして、更新時期を判断することとします。

表1. 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級

構造 種別 用途	鉄筋コンクリート造・ 鉄骨鉄筋コンクリート造		鉄骨造			ブロック造・ れんが造	木造
			重量鉄骨		軽量鉄骨		
	高品質の 場合	普通品質の 場合	高品質の 場合	普通品質の 場合			
学校 官庁	Y0100 以上	Y060 以上	Y0100 以上	Y060 以上	Y040 以上	Y060 以上	Y060 以上
住宅 事務所 病院	Y0100 以上	Y060 以上	Y0100 以上	Y060 以上	Y040 以上	Y060 以上	Y040 以上
店舗 旅館 ホテル	Y0100 以上	Y060 以上	Y0100 以上	Y060 以上	Y040 以上	Y060 以上	Y040 以上
工場	Y040 以上	Y025 以上	Y040 以上	Y025 以上	Y025 以上	Y025 以上	Y025 以上

Y0〇〇:目標となる耐用年数のある範囲で示した時の「級」を表す。

表2. 目標耐用年数の級の区分の例

目標耐用年数 級	代表値	範囲			下限値
Y0100	100年	80	～	120年	80年
Y060	60年	50	～	80年	50年
Y040	40年	30	～	50年	30年
Y025	25年	20	～	30年	20年

### 3 個別施設計画推進に向けた取組み

#### ○関係所管課との連携

公共施設マネジメントは施設所管課が単独でできるものではないため、施設の複合化・集約化などの議論や施設点検結果に基づく対策への助言など、庁内で横断的な連携を図り、計画の推進に向けて取り組んでいきます。

#### ○点検体制の構築

施設の適切な管理を推進するため、日常的な管理・点検のほか、法定点検を確実に実施するとともに、これらの点検から得られた各種点検結果のデータを整理し、施設情報の蓄積を積極的に行っていくこととします。

#### ○進捗管理の徹底

本計画の進捗確認のため、施設ごとの状態や計画に基づく実施状況を継続的に把握することとします。また、対策の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても、社会情勢や政策動向等、市民のニーズの変化に対応し、適宜、計画内容の見直しを行います。見直しの際には、本市の最上位計画である総合計画や上位計画である総合管理計画との整合性を確保した上で適切に行うこととします。

#### 4 対象施設の現況

##### 対象施設

(大分類:スポーツ・レクリエーション系施設、中分類:スポーツ施設)

No.	施設名称	所在地	建築年度	延床面積	構造	所管課
			(西暦)	(㎡)	※1	
1	各務原市総合体育館	那加太平町2丁目100番地	1983	5757.21	RC	スポーツ課
2	各務原市那加地区体育館	那加新加納町2225番地	1980	420.64	RC	スポーツ課
3	各務原市稲羽地区体育館	神置町3丁目327番地	1981	453.00	RC	スポーツ課
4	各務原市鵜沼地区体育館	つつじが丘4丁目138番地	1985	527.60	RC	スポーツ課
5	各務原市鵜沼西地区体育館	鵜沼各務原町6丁目7番地	1986	519.62	RC	スポーツ課
6	各務原市蘇原地区体育館	蘇原古市場町5丁目2番地	1985	514.41	RC	スポーツ課
7	各務原市川島スポーツ公園	川島小網町2146番地1	1979等	479.50	RC	スポーツ課
8	各務原スポーツ広場 ・各務野スポーツの森	各務山の前町1丁目47番地1	1989	323.92	RC	スポーツ課
9	各務原市民球場	須衛町2丁目601番地	1989	1001.59	RC	スポーツ課
10	各務原勤労者総合グラウンド	須衛町2丁目600番地	1989	233.00	RC	スポーツ課
11	各務原市弓道場	各務山の前町2丁目85番地1	2020	558.58	S	スポーツ課
12	各務原市民プール	鵜沼小伊木町4丁目300番地	1989等	6982.69	RC ・S	スポーツ課
13	各務原市空の森運動公園	鵜沼朝日町1丁目107番地1	2011	25.00	RC	スポーツ課
14	各務原市総合運動公園	下中屋町974番地	2014	375.00	RC	スポーツ課
15	各務原市ホッケー場 ※2	下切町6丁目1番地1	2005	-	-	スポーツ課
16	協定グラウンド	三井東町2丁目	1967	31.99	RC	スポーツ課
17	各務原市飛鳥球場 ※2	蘇原北山町2丁目81番地	1981	-	-	スポーツ課
計				18203.75		

※1 構造 RC:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造

※2 各務原市ホッケー場、各務原市飛鳥球場については、  
施設内に建築物がないため、延床面積を計上していません。


##### 【対象外施設】

各務原市川島小網堤外グラウンドは、施設内に建築物がなく、  
かつ維持費用も少額であるため、この計画では対象外の施設としています。

No.	施設名称	所在地	建築年度	延床面積	構造	所管課
			(西暦)	(㎡)	※1	
1	各務原市川島小網 堤外グラウンド	川島小網町標場東	1997	-	-	スポーツ課



## 位置図

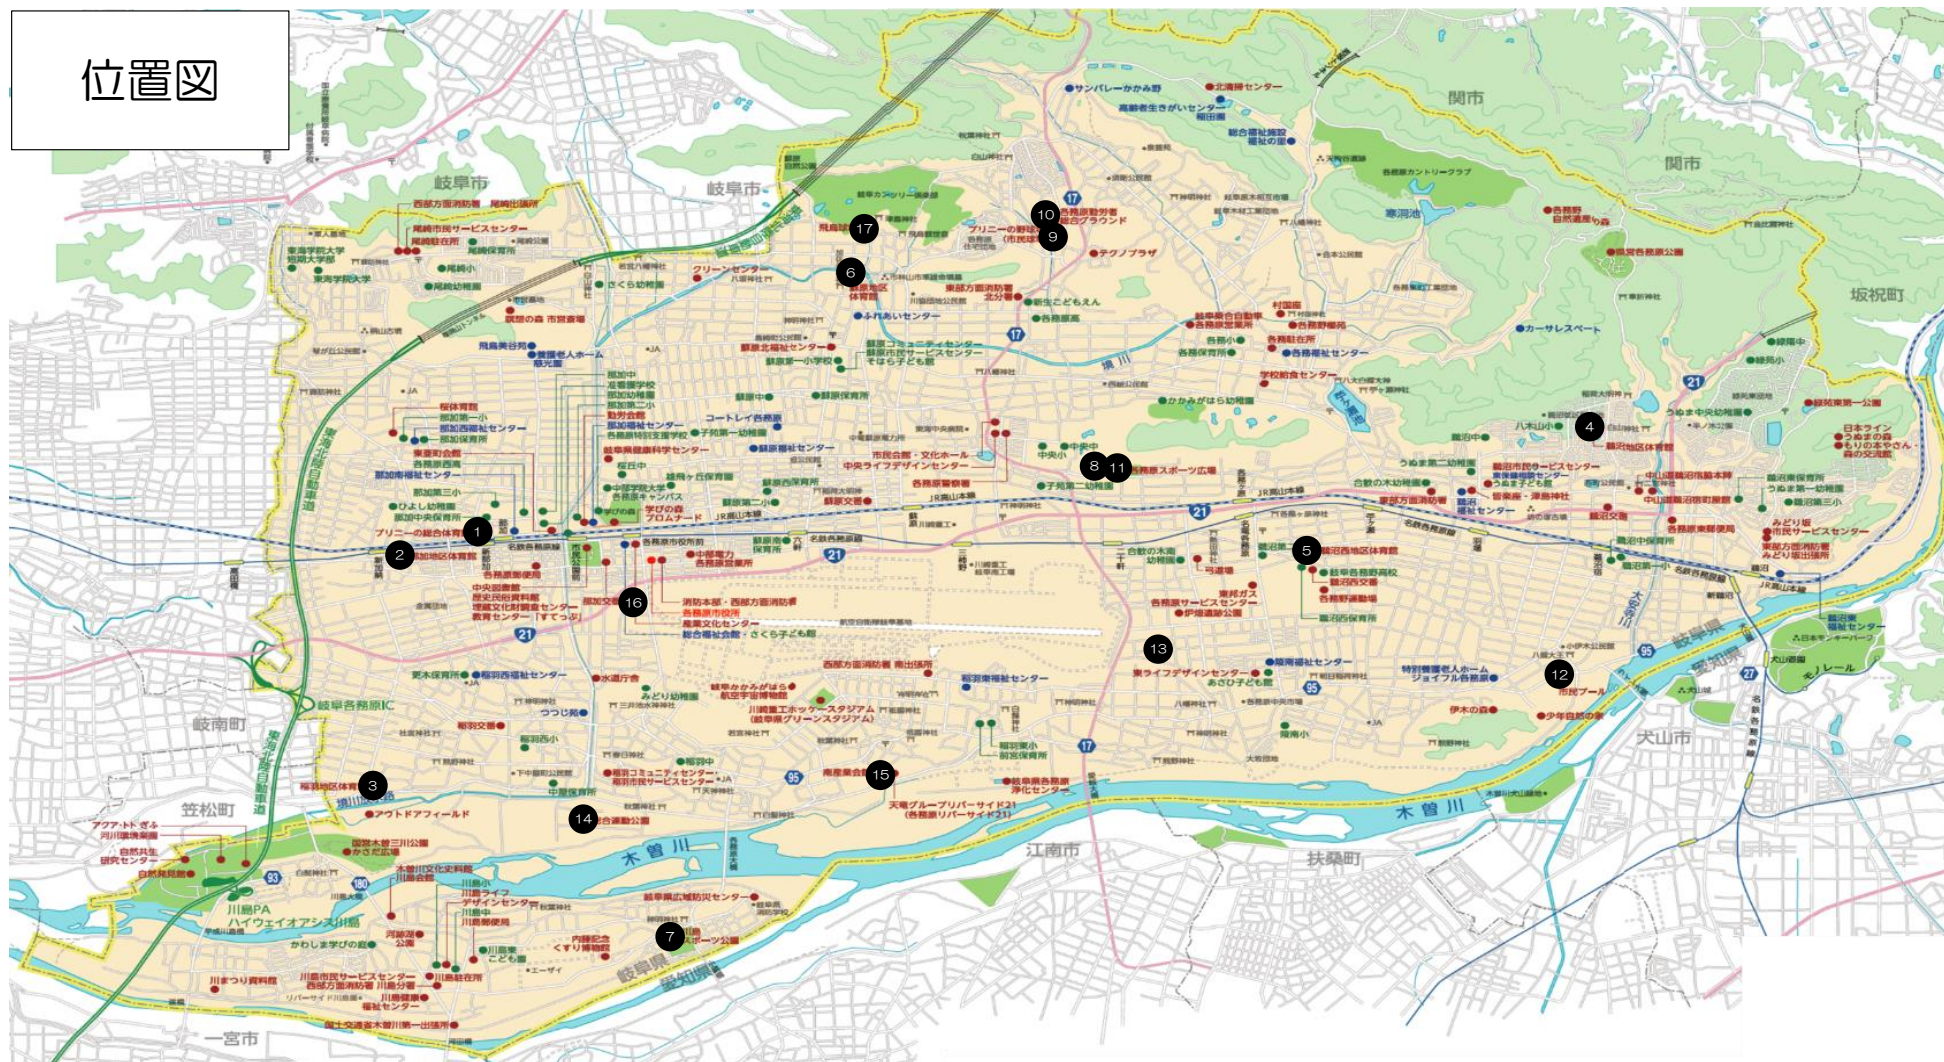



## 【施設状況シート】

施設番号

1

施設名称	各務原市総合体育館
所在地	那加太平町2丁目100番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1983
延床面積(m <sup>2</sup> )	5757.21
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
メインアリーナ	1
サブアリーナ	1
大会議室	1
役員室、放送室	1
ミーティングルーム	1
トレーニングルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00～22:00	年末年始
土・日・祝日	9:00～22:00	

2 運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置：正職4、アシストスタッフ3

3 利用状況

<施設利用者の推移>(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
158,213	188,540	187,464	207,937	220,840	219,778	218,054	193,924	93,433	130,630	152,636	166,133	171,196

<施設稼働率の推移>(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
58.7	69.2	70.1	73.2	75.2	74.0	74.9	71.5	85.8	83.9	81.6	81.7	79.6

<施設利用料収入の推移>(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
12,748	14,922	15,593	17,597	18,555	19,436	19,003	16,681	7,767	9,042	11,653	12,849	13,858

・稼働率は主たる施設であるメインアリーナ、サブアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・トレーニングルームのフリーウェイトに人気があり、利用者が集中する。

・メインアリーナの土日祝日の利用は、ほとんどが大会等となっている。

・車いすでの入退場が困難であるため、バリアフリー化の整備が必要である。

・駐車場が狭く、大会等があると混雑し、利用者や周辺住民から苦情が寄せられる。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加地区体育館	おおよその直線距離(m)	600
------------	----	-----	---------	--------------	-----

## 【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
外壁の破損等	外壁が破損している	令和6年6月5日

## 【施設状況シート】

施設番号

2

施設名称	各務原市那加地区体育館
所在地	那加新加納町2225番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1980
延床面積(m <sup>2</sup> )	420.64
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

## 1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00~22:00	年末年始
土・日・祝日	9:00~22:00	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日~令和11年3月31日)

職員配置:なし

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
12,782	11,245	11,671	7,274	14,750	13,754	13,168	14,484	9,998	10,558	11,699	12,127	17,494

&lt;施設稼働率の推移&gt;(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
58.8	56.1	56.8	50.4	70.9	70.5	64.2	65.2	69.2	71.2	63.2	64.5	66.7

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
631	642	628	389	828	761	720	769	610	717	776	854	825

・平成27年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。

・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。

・平成27年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合体育館	おおよその直線距離(m)	600
------------	----	-----	-------	--------------	-----

現状把握

## 【施設状況シート】

施設番号

3

施設名称	各務原市稲羽地区体育館
所在地	神置町3丁目327番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1981
延床面積(㎡)	453.00
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00～22:00	年末年始
土・日・祝日	9:00～22:00	

2 運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置：なし

3 利用状況

<施設利用者の推移>(単位：人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
11,213	12,048	13,756	14,019	14,417	16,262	16,055	6,892	8,863	9,106	11,500	12,340	14,049

<施設稼働率の推移>(利用時間/利用可能時間、単位：％)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
60.3	61.2	54.7	58.9	60.2	62.8	60.5	60.0	63.0	64.9	62.4	66.8	69.1

<施設利用料収入の推移>(単位：千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
687	608	655	632	696	706	687	263	553	611	741	854	892

・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。

・令和元年度に改修工事を実施した。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	那加地区体育館	おおよその直線距離(m)	2,100
------------	----	-----	---------	--------------	-------

## 【施設状況シート】

施設番号

4

施設名称	各務原市鵜沼地区体育館
所在地	つつじが丘4丁目138番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1985
延床面積(m <sup>2</sup> )	527.60
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00～22:00	年末年始
土・日・祝日	9:00～22:00	

2 運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置：なし

3 利用状況

<施設利用者の推移>(単位：人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
14,193	15,652	16,529	16,054	19,569	8836	16,595	17,148	14,595	15,696	18,176	15,861	15,667

<施設稼働率の推移>(利用時間/利用可能時間、単位：%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
58.0	61.5	61.5	61.7	68.4	62.9	64.5	64.4	80.9	78.0	77.0	70.6	72.5

<施設利用料収入の推移>(単位：千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
685	678	701	726	802	353	751	749	685	695	815	748	783

・平成29年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。

・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。

・平成29年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼西地区体育館	おおよその直線距離(m)	2,500
------------	----	-----	----------	--------------	-------

## 【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
敷地内の通路の確保の状況	犬走モルタルに浮きが見られる	令和5年6月27日

## 【施設状況シート】

施設番号

5

施設名称	各務原市鵜沼西地区体育館
所在地	鵜沼各務原町6丁目7番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1986
延床面積(m <sup>2</sup> )	519.62
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00～22:00	年末年始
土・日・祝日	9:00～22:00	

2 運営主体、管理方法等

指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置：なし

3 利用状況

<施設利用者の推移>(単位：人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
27,624	27,194	28,342	24,997	27,628	13,444	27,245	26,445	18,373	19,288	23,998	24,561	23,649

<施設稼働率の推移>(利用時間/利用可能時間、単位：%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
77.7	78.3	78.0	78.2	83.6	80.6	82.2	76.5	84.9	86.0	82.6	86.7	86.0

<施設利用料収入の推移>(単位：千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
859	903	891	909	940	513	954	879	775	830	1,047	1,081	1,083

・平成29年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。

・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。

・平成29年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	鵜沼地区体育館	おおよその直線距離(m)	2,500
------------	----	-----	---------	--------------	-------

## 【施設状況シート】

施設番号

6

施設名称	各務原市蘇原地区体育館
所在地	蘇原古市場町5丁目2番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1985
延床面積(m <sup>2</sup> )	514.41
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
アリーナ	1
多目的ルーム	1

現状把握

## 1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00～22:00	年末年始
土・日・祝日	9:00～22:00	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成19年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置:なし

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
14,948	16,514	16,379	17,209	10,042	20,124	17,703	18,100	13,438	14,850	16,218	15,508	17,058

&lt;施設稼働率の推移&gt;(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
62.1	64.9	65.8	65.5	64.1	75.1	72.2	70.9	75.2	71.9	73.4	73.2	73.7

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
609	659	704	756	453	816	778	873	670	691	839	926	938

・平成28年度は改修工事により利用停止期間があったため利用者が減少した。

・稼働率は主たる施設であるアリーナの稼働率を示している。

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・アリーナの利用が中心である。

・平成28年度に改修工事を行ったが、多目的ルームの稼働率が低い。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合体育館	およその直線距離(m)	3,900
------------	----	-----	-------	-------------	-------

## 【公共施設等現地調査結果整理表】

点検項目	状況等	点検実施日
階段各部の劣化及び損傷の状況	階段部に浮きがみられる	令和5年6月28日

## 【施設状況シート】

施設番号

7

施設名称	各務原市川島スポーツ公園
所在地	川島小網町2146番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	施設内訳のとおり
延床面積(㎡)	479.50
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
管理棟	1
屋外プール	1
多目的グラウンド	1
野球場	1
テニスコート	5
ミーティングルーム	1

施設内訳 ( )内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1 管理棟(RC造)	1987	310.8
2 屋外トイレ(RC造)	1979	13.2
3 屋外トイレ(RC造)	1979	12.1
4 屋外トイレ(RC造)	1980	21.0
5 ポンプ室(RC造)	1979	20.0
6 野球場施設(RC造)	1979	42.4
7 野球場施設(RC造)	1979	30.0
8 野球場施設(RC造)	1979	30.0

## 1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	9:00~19:00	年末年始
土・日・祝日	9:00~19:00	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日~令和11年3月31日)

職員配置:アシストスタッフ3

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
28,619	29,233	24,589	27,341	27,199	24,261	26,238	22,175	17,663	25,931	29,184	37,082	42,484

&lt;施設稼働率の推移&gt;(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
18.0	18.2	17.8	20.7	18.9	17.0	16.6	11.5	27.6	32.7	29.4	30.4	32.2

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
1,343	1,589	1,256	1,066	1,105	1,097	1,089	746	1,391	1,990	2,422	2,395	2,605

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・屋外プールは令和元年度に解体完了。

・テニスコートはクレーコートから人工芝4面・ハード1面に令和2年度改修。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無		施設名	おおよその直線距離(m)
多目的グラウンド野球場	あり	川島小網堤外グラウンド	300
テニスコート	あり	各務原スポーツ広場・各務野スポーツの森	5,700

現状把握



## 【施設状況シート】

施設番号

8

施設名称	各務原スポーツ広場・各務野スポーツの森
所在地	各務山の前町1丁目47番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1989
延床面積(㎡)	323.92
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
多目的グラウンド	1
テニスコート	12

施設内訳 ( )内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1 管理棟(RC造)	1989	282.42
2 トイレ(RC造)	1989	21.0
3 倉庫1(RC造)	1989	10.5
4 倉庫2(RC造)	1989	10.0

## 1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	7:00～22:00	年末年始
土・日・祝日	7:00～22:00	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置:正職4、アシストスタッフ3

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
75,878	84,119	90,206	92,757	91,326	87,388	86,258	77,441	53,731	65,896	77,542	72,560	75,423

&lt;施設稼働率の推移&gt;(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
47.2	49.4	50.9	56.9	58.2	55.1	53.2	49.6	42.3	46.3	41.6	39.8	40.3

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
14,214	15,212	16,040	17,952	18,035	17,276	16,713	16,366	11,779	13,287	15,629	15,215	15,708

・稼働率はテニスコート、多目的グラウンドの稼働率を示している。

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・平日の夜間、土・日・祝日に利用が集中している。

・天然芝の多目的グラウンドは、大会や公式戦などを良好な状態で利用できるよう、天然芝を保護する目的で試合のみの利用に制限している。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無		施設名	おおよその直線距離(m)
多目的グラウンド野球場	あり	勤労者総合グラウンド	2,300
テニスコート	あり	川島スポーツ公園	5,700

現状把握

## 【施設状況シート】

施設番号

9

施設名称	各務原市民球場
所在地	須衛町2丁目601番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1989
延床面積(㎡)	1001.59
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
管理棟	1
野球場	1

現状把握

## 1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	7:00~19:00	12月28日~2月末日
土・日・祝日	7:00~19:00	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日~令和11年3月31日)

職員配置:正職1、アシストスタッフ3

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
13,739	15,180	14,420	14,368	12,769	15,380	15,290	16,376	9,167	10,297	14,135	13,337	14,865

&lt;施設稼働率の推移&gt;(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
32.8	26.9	28.8	30.4	28.7	36.6	38.4	36.3	28.5	45.5	34.9	35.4	36.7

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
528	766	732	732	544	934	884	717	394	858	913	752	859

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

- ・平日の利用がほとんどなく、土・日・祝日に利用が集中している。
- ・天然芝の保護や不均一な育成によるイレギュラーバウンドの発生などを防止するため、試合のみの利用に制限している。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	飛鳥球場	おおよその直線距離(m)	1,500
------------	----	-----	------	--------------	-------

## 【施設状況シート】

施設番号 10

施設名称	各務原勤労者総合グラウンド
所在地	須衛町2丁目600番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1989
延床面積(㎡)	233.00
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
管理棟	1
多目的グラウンド	1

## 1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	7:00~22:00	年末年始
土・日・祝日	7:00~22:00	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日~令和11年3月31日)

職員配置:なし

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
13,746	16,677	18,330	16,494	16,836	15,230	17,400	16,617	10,521	7,258	13,809	11,536	12,318

&lt;施設稼働率の推移&gt;(利用時間/利用可能時間、単位:%)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
34.9	32.4	33.7	36.9	37.1	31.6	31.5	31.3	23.7	26.9	23.0	20.8	25.5

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
840	1,037	1,213	1,275	1,459	1,408	1,427	1,446	1,005	767	1,181	1,123	1,322

現状把握

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・平日の夜間、土・日・祝日に利用が集中している。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	各務原スポーツ広場 ・各務野スポーツの森	おおよその直線距離(m)	2,300
------------	----	-----	-------------------------	--------------	-------

## 【施設状況シート】

施設番号

11

施設名称	各務原市弓道場
所在地	各務山の前町2丁目85番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	2021
延床面積(㎡)	558.58
構造	S造

施設内訳 ( )内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1 射場棟(S造)	2021	395.23
2 的場棟(S造)	2021	102.25
3 観覧棟(S造)	2021	61.10

現状把握

1 施設の概要								
各務原市体育施設条例に基づき設置								
<table><tr><th colspan="2">開館時間</th><th>休館日等</th></tr><tr><td>平日</td><td>9:00～22:00</td><td rowspan="2">年未年始</td></tr><tr><td>土・日・祝日</td><td>9:00～22:00</td></tr></table>	開館時間		休館日等	平日	9:00～22:00	年未年始	土・日・祝日	9:00～22:00
開館時間		休館日等						
平日	9:00～22:00	年未年始						
土・日・祝日	9:00～22:00							
2 運営主体、管理方法等								
指定管理：一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日～令和11年3月31日)								
職員配置：なし								
3 利用状況								
<施設利用者の推移>(単位：人)								
<table><tr><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>9,892</td><td>10,586</td><td>10,610</td><td>11,603</td></tr></table>	R3	R4	R5	R6	9,892	10,586	10,610	11,603
R3	R4	R5	R6					
9,892	10,586	10,610	11,603					
<施設利用料収入の推移>(単位：千円)								
<table><tr><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>2,030</td><td>2,479</td><td>2,650</td><td>2,689</td></tr></table>	R3	R4	R5	R6	2,030	2,479	2,650	2,689
R3	R4	R5	R6					
2,030	2,479	2,650	2,689					
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)								
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)								
<table><tr><td>類似機能の施設の有無</td><td>なし</td><td>施設名</td><td>—</td><td>おおよその直線距離(m)</td><td>—</td></tr></table>	類似機能の施設の有無	なし	施設名	—	おおよその直線距離(m)	—		
類似機能の施設の有無	なし	施設名	—	おおよその直線距離(m)	—			

## 【施設状況シート】

施設番号

12

施設名称	各務原市民プール
所在地	鵜沼小伊木町4丁目300番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	施設内訳のとおり
延床面積(㎡)	6982.69
構造	施設内訳のとおり

## 【施設構成】

名称	構成数
屋内温水プール	1
トレーニングルーム	1
屋外50mプール	1
屋外レジャープール	1

	施設内訳 ( )内は構造	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡)		施設内訳 ( )内は構造	建築年度 (西暦)	延床面積 (㎡)
1	温水プール(管理棟)(RC造)	1989	3479.00	6	機械室(RC造)	1990	385.00
2	車庫(S造)	1990	50.40	7	機械室(RC造)	1990	35.00
3	売店(RC造)	1990	34.32	8	更衣室(RC造)	1990	789.81
4	売店(RC造)	1990	16.20	9	倉庫(S造)	1990	262.44
5	食堂(RC造)	1990	204.00	10	屋外50mプール(RC造)	1991	1726.52

## 1 施設の概要

各務原市民プール条例に基づき設置

営業時間は屋外プール営業時のもの

開館時間		休館日等
平日	9:00~21:30	木曜日・休日の翌日・年末年始
土・日・祝日	9:00~21:30	

## 2 運営主体、管理方法等

指定管理:株式会社愛知スイミング(平成17年4月1日~令和8年3月31日)

職員配置:営業状況により変動

## 3 利用状況

&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
154,361	175,227	153,771	165,991	175,723	167,942	163,121	141,947	31,944	29,637	87,291	105,106	77,504

&lt;施設利用料収入の推移&gt;(単位:千円)

H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6
47,886	51,139	39,047	47,335	50,568	46,629	44,230	38,033	4,760	3,842	21,153	28,351	13,543

・屋外プールが猛暑による利用者減少のため、平成28年度をピークに減少傾向である。

## 4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・トイレ洋式化の要望がある。

・令和6年度より小学校の水泳授業の受け入れを行っている。

## 5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	コパンスポーツクラブ鵜沼	おおよその直線距離(m)	1,600
------------	----	-----	--------------	--------------	-------

## 6 特記事項

施設の老朽化により維持費用が増加傾向にある。屋外プールについては、将来的な運用について検討を行っている。

現状把握

## 【施設状況シート】

施設番号

13

施設名称	各務原市空の森運動公園
所在地	鵜沼朝日町1丁目107番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	2011
延床面積(㎡)	25.00
構造	RC造

## 【施設構成】

名称	構成数
トイレ	1

## 現状把握

## 1 施設の概要

各務原市民広場設置条例に基づき設置

常時利用可能

## 2 運営主体、管理方法等

管理主体:市

職員配置:なし

## 3 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・競技用に整備された芝生のピッチではないため、グラウンド・ゴルフ、子どものサッカー練習などに利用されている。

・岐阜基地滑走路の延長線上にあるため、航空機の写真を撮るために人が集まりやすい。

## 4 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	各務原スポーツ広場・各務野スポーツの森	おおよその直線距離(m)	1,600
------------	----	-----	---------------------	--------------	-------

## 5 特記事項

## 【施設状況シート】

施設番号

14

施設名称	各務原市総合運動公園
所在地	下中屋町974番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	2014(大規模改修)
延床面積(㎡)	375.00
構造	施設内訳のとおり

## 【施設構成】

名称	構成数
陸上競技場	1
一般サッカー場	1
少年サッカー場	1
一般野球場	2
少年野球場	1
ソフトボール場	10
アーチェリー場	1
トイレ	9
倉庫	22

施設内訳 ( )内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1 トイレ9棟(RC造)	2014	45
2 倉庫22棟(プレハブ)	2014	330

現 状 把 握	1 施設の概要																																																				
	各務原市体育施設条例に基づき設置																																																				
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>平日</td> <td>9:00～19:00</td> <td rowspan="2">年末年始</td> </tr> <tr> <td>土・日・祝日</td> <td>9:00～19:00</td> </tr> </table>	開館時間		休館日等	平日	9:00～19:00	年末年始	土・日・祝日	9:00～19:00																																												
	開館時間		休館日等																																																		
	平日	9:00～19:00	年末年始																																																		
土・日・祝日	9:00～19:00																																																				
2 運営主体、管理方法等																																																					
指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成27年4月1日～令和11年3月31日) 職員配置:正職3、アシストスタッフ4																																																					
3 利用状況																																																					
	<施設利用者の推移>(単位:人) <table border="1"> <tr> <td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td> </tr> <tr> <td>98,162</td><td>95,513</td><td>69,920</td><td>69,328</td><td>86,716</td><td>84,412</td><td>111,036</td><td>111,569</td><td>77,698</td><td>102,623</td><td>135,413</td><td>142,290</td><td>122,209</td> </tr> </table> <施設利用料収入の推移>(単位:千円) <table border="1"> <tr> <td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td> </tr> <tr> <td>1,747</td><td>1,849</td><td>1,284</td><td>1,685</td><td>2,694</td><td>3,145</td><td>3,660</td><td>4,670</td><td>3,145</td><td>4,435</td><td>5,451</td><td>5,952</td><td>5,706</td> </tr> </table>	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	98,162	95,513	69,920	69,328	86,716	84,412	111,036	111,569	77,698	102,623	135,413	142,290	122,209	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,747	1,849	1,284	1,685	2,694	3,145	3,660	4,670	3,145	4,435	5,451	5,952	5,706
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																									
98,162	95,513	69,920	69,328	86,716	84,412	111,036	111,569	77,698	102,623	135,413	142,290	122,209																																									
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6																																									
1,747	1,849	1,284	1,685	2,694	3,145	3,660	4,670	3,145	4,435	5,451	5,952	5,706																																									
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																																																					
	・陸上競技場の内部にある天然芝サッカー場は、大会や公式戦などを良好な状態で利用できるよう、天然芝を保護する目的で試合のみの利用に制限している。 ・平日の使用が特に少ない。																																																				
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																																																					
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">類似機能の施設の有無</th> <th>施設名</th> <th>およその直線距離(m)</th> </tr> <tr> <td>陸上競技場(グラウンド) サッカー場、野球場</td> <td>あり</td> <td>川島スポーツ公園</td> <td>1,400</td> </tr> <tr> <td>アーチェリー場</td> <td>なし</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無		施設名	およその直線距離(m)	陸上競技場(グラウンド) サッカー場、野球場	あり	川島スポーツ公園	1,400	アーチェリー場	なし	—	—																																								
類似機能の施設の有無		施設名	およその直線距離(m)																																																		
陸上競技場(グラウンド) サッカー場、野球場	あり	川島スポーツ公園	1,400																																																		
アーチェリー場	なし	—	—																																																		



## 【施設状況シート】

施設番号

15

施設名称	各務原市ホッケー場
所在地	下切町6丁目1番地1
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	2005
延床面積(㎡)	-
構造	-

## 【施設構成】

名称	構成数
ホッケー場	1

現状把握

1 施設の概要																										
各務原市ホッケー場条例に基づき設置																										
<table><tr><td colspan="2">開館時間</td><td>休館日等</td></tr><tr><td>平日</td><td>9:00～21:00</td><td rowspan="2">火曜日・年末年始</td></tr><tr><td>土・日・祝日</td><td>9:00～21:00</td></tr></table>	開館時間		休館日等	平日	9:00～21:00	火曜日・年末年始	土・日・祝日	9:00～21:00																		
開館時間		休館日等																								
平日	9:00～21:00	火曜日・年末年始																								
土・日・祝日	9:00～21:00																									
2 運営主体、管理方法等																										
管理主体:市																										
職員配置:なし																										
3 利用状況																										
<施設利用者の推移>(単位:人)																										
<table><tr><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>14,057</td><td>17,095</td><td>16,081</td><td>14,334</td><td>10,105</td><td>13,914</td><td>13,719</td><td>21,983</td><td>15,429</td><td>18,003</td><td>18,566</td><td>16,134</td><td>17,964</td></tr></table>	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	14,057	17,095	16,081	14,334	10,105	13,914	13,719	21,983	15,429	18,003	18,566	16,134	17,964
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6														
14,057	17,095	16,081	14,334	10,105	13,914	13,719	21,983	15,429	18,003	18,566	16,134	17,964														
<施設利用料収入の推移>(単位:千円)																										
<table><tr><td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td></tr><tr><td>1,359</td><td>1,667</td><td>1,524</td><td>1,444</td><td>1,175</td><td>1,166</td><td>1,817</td><td>2,933</td><td>1,444</td><td>1,806</td><td>1,767</td><td>1,671</td><td>1,630</td></tr></table>	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	1,359	1,667	1,524	1,444	1,175	1,166	1,817	2,933	1,444	1,806	1,767	1,671	1,630
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6														
1,359	1,667	1,524	1,444	1,175	1,166	1,817	2,933	1,444	1,806	1,767	1,671	1,630														
4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)																										
・主に、スポーツ少年団や中学校の部活動で利用されているほか、五輪予選、アジアカップ、インターハイ等の国内外の大規模な大会で選手のアップ会場としても利用されている。																										
5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																										
<table><tr><td>類似機能の施設の有無</td><td>あり</td><td>施設名</td><td>岐阜県グリーンスタジアム</td><td>おおよその直線距離(m)</td><td>50</td></tr></table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	岐阜県グリーンスタジアム	おおよその直線距離(m)	50																				
類似機能の施設の有無	あり	施設名	岐阜県グリーンスタジアム	おおよその直線距離(m)	50																					
6 特記事項																										

## 【施設状況シート】

施設番号

16

施設名称	協定グラウンド
所在地	三井東町2丁目
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1967
延床面積(㎡)	31.99
構造	RC造

施設内訳 ( )内は構造	建築年度(西暦)	延床面積(㎡)
1 トイレ(RC造)	1967	25.71
2 倉庫(RC造)	1967	6.28

現状把握	1 施設の概要																										
	航空自衛隊岐阜基地運動場使用に関する協定書に基づき設置																										
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">開館時間</th> <th>休館日等</th> </tr> <tr> <td>平日</td> <td>9:00~19:00</td> <td rowspan="2">年未年始</td> </tr> <tr> <td>土・日・祝日</td> <td>9:00~19:00</td> </tr> </table>	開館時間		休館日等	平日	9:00~19:00	年未年始	土・日・祝日	9:00~19:00																		
	開館時間		休館日等																								
	平日	9:00~19:00	年未年始																								
土・日・祝日	9:00~19:00																										
2 運営主体、管理方法等																											
施設の維持管理:市、貸出の管理:一般財団法人各務原市施設振興公社 職員配置:なし																											
3 利用状況																											
	<p>&lt;施設利用者の推移&gt;(単位:人)</p> <table border="1"> <tr> <td>H24</td><td>H25</td><td>H26</td><td>H27</td><td>H28</td><td>H29</td><td>H30</td><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td> </tr> <tr> <td>19,820</td><td>26,239</td><td>24,285</td><td>19,012</td><td>19,695</td><td>16,263</td><td>16,480</td><td>17,540</td><td>17,126</td><td>18,286</td><td>12,832</td><td>15,310</td><td>13,044</td> </tr> </table> <p>・利用料の設定なし</p>	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	19,820	26,239	24,285	19,012	19,695	16,263	16,480	17,540	17,126	18,286	12,832	15,310	13,044
H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6															
19,820	26,239	24,285	19,012	19,695	16,263	16,480	17,540	17,126	18,286	12,832	15,310	13,044															
4 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)																											
	<table border="1"> <tr> <td>類似機能の施設の有無</td> <td>あり</td> <td>施設名</td> <td>総合運動公園</td> <td>おおよその直線距離(m)</td> <td>2,000</td> </tr> </table>	類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合運動公園	おおよその直線距離(m)	2,000																				
類似機能の施設の有無	あり	施設名	総合運動公園	おおよその直線距離(m)	2,000																						
6 特記事項																											

## 【施設状況シート】

施設番号

17

施設名称	各務原市飛鳥球場
所在地	蘇原北山町2丁目81番地
施設所管課	教育委員会事務局スポーツ課
施設類型(大分類)	スポーツ・レクリエーション系施設
施設類型(中分類)	スポーツ施設
建築年度(西暦)	1981
延床面積(㎡)	-
構造	-

## 【施設構成】

名称	構成数
野球場	1

現状把握

1 施設の概要

各務原市体育施設条例に基づき設置

開館時間		休館日等
平日	7:00～19:00	年未年始
土・日・祝日	7:00～19:00	

2 運営主体、管理方法等

指定管理:一般財団法人各務原市施設振興公社(平成18年4月1日～令和11年3月31日)

職員配置:なし

3 利用状況

<施設利用者の推移>(単位:人)

R2	R3	R4	R5	R6
10,726	11,930	14,524	14,210	16,348

<施設利用料収入の推移>(単位:千円)

R2	R3	R4	R5	R6
212	192	245	218	283

4 課題(利用実態・特徴、利用者からの要望、施設の問題点、今後の利用見込み等)

・市内公共施設のうち、市民球場と飛鳥球場は硬式野球での使用が可能である。

5 類似施設(市内で最も近接した類似機能を持つ公共施設・民間施設はどこか)

類似機能の施設の有無	あり	施設名	市民球場	おおよその直線距離(m)	1,500
------------	----	-----	------	--------------	-------

6 特記事項

## 5 長寿命化の対策内容と実施時期、対策費用

### 対策費用算出にあたっての前提条件

- ・修繕や改修を実施することによって、建物の長寿命化を図っていきますが、「2 施設の今後の方針と改修等の優先順位付け (3)目標使用年数」で設定した目標使用年数が経過した時点で、更新(建替え)をすることとして費用を算出しています。
- ・更新(建替え)予定年度から遡って5年間は、施設や設備の改修を行わないこととします。
- ・主要構造部(屋根、壁など)の改修及び主な設備(空調、給排水衛生設備など)の改修について、それぞれ改修単価及び耐用年数を設定し、概算工事費を算出しています。
- ・各部位や各設備の改修単価は、実勢価格や過去の工事履歴等を参考に設定していますが、工事実施前には施設の詳細な調査等が必要であり、算出した対策費用と異なる場合があります。
- ・各部位や各設備の耐用年数は、下表を標準としています。ただし、対策費用の平準化や改修時期の調整等により、これによらない場合があります。

種別	耐用年数	種別	耐用年数
屋上防水(塩ビ)	20年	外壁(塗装・建具シーリング含む)	15年
屋根(塗装)	7年	屋根(フッ素樹脂ガリバリウム鋼板)	20年
屋根(瓦)	20年	門扉、塀、囲い	20年
空調(個別式)	15年	空調(中央式)	20年
火災警報設備	15年	給排水衛生設備	25年
受変電設備	25年	自家発電設備	25年
中央監視設備	15年	受水槽・高架水槽設備	15年
昇降設備	30年	手摺	20年
自動ドア	12年		

- ・概算工事費には、工事費のほか設計委託料、監理委託料を含みます。
- ・維持補修費用(施設を維持するために要する例年の修繕料)や保守点検費用(設備等を正常な状態に保つために要する定期点検費用)は、1施設あたり1,000千円以上の場合のみ計上します。
- ・施設自体を維持するための費用以外の業務委託料(指定管理料、清掃、除草等)は計上していません。
- ・施設毎の長寿命化に係る対策内容と実施時期、費用は次頁以降のとおりです。ただし、対策の実施時期、内容は財政状況や政策動向等によって変更する可能性があります。

【対策費用算定表】(総括表)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	13,021,957千円	325,549千円

(単位:千円)

	建築年度 (西暦)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
各務原市総合体育館	1983	8,646		3,179		4,380	142,914		5,967	102,440	8,920	194,396	9,922	87,242	2,329	30,900	102,440							102,440						1,036,298	1,036,298												2,878,711
各務原市那加地区体育館	1980								756	12,986		14,496	12,261														151,430																191,929
各務原市稲羽地区体育館	1981											12,750		897	9,151	14,442											163,080																200,320
各務原市鵜沼地区体育館	1985												10,666		12,637		17,055														189,936												230,294
各務原市鵜沼西地区体育館	1986												10,504	897	13,936				16,796												187,063												229,196
各務原市蘇原地区体育館	1985			2,805					869	14,912			3,127	15,390			16,635														185,188												238,925
各務原市川島スポーツ公園	1987	107,433		7,358								33,475		3,094	8,443		1,617					33,475					13,501							111,888									320,283
各務原市川島スポーツ公園(附属棟)	1979				3,850		77,000							4,840						4,659						60,732																	151,081
各務原市スポーツ広場 等	1989	37,765				715	50,168	27,703	14,982			44,528	24,494	44,528		17,149	22,264		22,264	22,264		22,264	44,528	10,466	523	50,754	2,230								116,611							576,200	
各務原市民球場	1989	1,001	15,273	3,047	29,830	70,015	35,216	84,293			4,659	4,510				3,127	4,510				69,300	4,510			23,432		4,510	37,468								360,572							755,273
各務原勤労者総合グラウンド	1989		34,334	5,170						1,790				7,167				1,790	897						1,790	7,526			7,167							83,880							151,511
各務原市弓道場	2020		24,844		3,025							2,335					8,797						2,335				7,526					8,797		2,335									59,993
各務原市民プール	1989	31,661	105,394	22,561	4,813	176,198	609,193					372,812	2,230	359,550	153,617		25,875		6,471	11,141	152,889	543,214	897	13,455		34,027	114,440	12,274					1,200,573	1,200,573								5,153,857	
各務原市民プール(車庫、倉庫)	1990																				112,622																						112,622
各務原市空の森運動公園	2011								3,784					2,933					808					3,784										2,933				3,784					18,025
各務原市総合運動公園	2014	5,775				28,380			9,691						380,292			10,659	255,000					167,802											167,802								1,025,400
各務原市ホッケー場	2005									139,755	31,491						70,749			139,755									139,755											139,755			661,260
協定グラウンド	1967			15,031										11,516																													26,547
各務原市飛鳥球場	1981		24,380			946																										15,205											40,531
合 計		192,281	204,225	59,151	41,518	280,634	914,491	111,996	36,049	270,093	46,860	679,301	73,204	538,054	580,405	65,617	210,376	61,355	12,364	444,945	102,705	303,496	567,813	151,648	216,945	68,781	261,748	317,218	19,441	1,176,050	1,036,298	383,920	202,268	117,156	1,368,375	1,761,636	0	0	3,784	139,755	0	13,021,957	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	1
施 設 名	各務原市総合体育館
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1983
構造	RC
法定耐用年数	47年(2030)
目標使用年数	65年(2048)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	2,878,711千円	71,968千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20					1,540	37,785																																				39,325	
屋根(塗装)	7								5,967	102,440							102,440							102,440																			313,287	
外壁(塗装)	15													63,042																													63,042	
空調(個別式)	15										8,920																																8,920	
給排水衛生設備	25						6,861					145,996																															152,857	
中央監視設備	15														2,329																												2,329	
受変電設備	25											48,400																															48,400	
自家発電設備	25													24,200																													24,200	
火災警報設備	15												9,922																														9,922	
昇降設備	30															30,900																											30,900	
照明設備	-	6,380				2,840	98,268																																				107,488	
天井	-	2,266		3,179																																							5,445	
維持管理費用																																											0	
保守点検費用																																											0	
更新	65																														1,036,298	1,036,298												2,072,596
合 計		8,646	0	3,179	0	4,380	142,914	0	5,967	102,440	8,920	194,396	9,922	87,242	2,329	30,900	102,440	0	0	0	0	0	0	0	102,440	0	0	0	0	0	1,036,298	1,036,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,711

○総合体育館は施設規模が大きいため、更新(建替え)は2年間で行うこととし、更新(建替え)費用を2年間にわたり均等に配分して計上しています。

【対策費用算定表】

施 設 番 号	2
施 設 名	各務原市那加地区体育館
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1980
構造	RC
法定耐用年数	47年(2027)
目標使用年数	65年(2045)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	191,929千円	4,798千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20								756	12,986																																	13,742	
外壁(塗装)	15												12,261																														12,261	
給排水衛生設備	25											13,599																															13,599	
火災警報設備	15											897																															897	
維持管理費用																																											0	
保守点検費用																																											0	
更新	65																										151,430																151,430	
合 計		0	0	0	0	0	0	0	756	12,986	0	14,496	12,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,929



【対策費用算定表】

施 設 番 号	3
施 設 名	各務原市稲羽地区体育館
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1981
構造	RC
法定耐用年数	47年(2028)
目標使用年数	65年(2046)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	200,320千円	5,008千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20														9,151																												9,151		
外壁(塗装)	15															14,442																												14,442	
給排水衛生設備	25																																											0	
火災警報設備	15													897																														897	
浄化槽設備	-											12,750																																12,750	
更新	65																											163,080																	163,080
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750	0	897	9,151	14,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,320	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	4
施 設 名	各務原市鵜沼地区体育館
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	47年(2032)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	230,294千円	5,757千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20												10,666																														10,666
外壁(塗装)	15														11,740																												11,740
給排水衛生設備	25																	17,055																									17,055
火災警報設備	15														897																												897
更新	65																																189,936										189,936
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,666	0	12,637	0	0	17,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,294

【対策費用算定表】

施 設 番 号	5
施 設 名	各務原市鵜沼西地区体育館
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1986
構造	RC
法定耐用年数	47年(2033)
目標使用年数	65年(2051)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	229,196千円	5,730千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20												10,504																														10,504		
外壁(塗装)	15														13,936																													13,936	
給排水衛生設備	25																			16,796																								16,796	
火災警報設備	15													897																														897	
更新	65																																												187,063
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,504	897	13,936	0	0	0	0	16,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,196	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	6
施 設 名	各務原市蘇原地区体育館
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1985
構造	RC
法定耐用年数	47年(2032)
目標使用年数	65年(2050)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	238,925千円	5,973千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20								869	14,912																																	15,781	
外壁(塗装)	15													15,390																														15,390
空調(個別式)	15												2,230																															2,230
給排水衛生設備	25			2,805														16,635																										19,440
火災警報設備	15												897																															897
更新	65																																185,188											185,188
合 計		0	0	2,805	0	0	0	0	869	14,912	0	0	3,127	15,390	0	0	0	16,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,925	

【対策費用算定表】

施 設 番 号	7 - 1
施 設 名	各務原市川島スポーツ公園
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1987
構造	RC
法定耐用年数	50年(2037)
目標使用年数	65年(2052)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	320,283千円	8,007千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
屋上防水	20														8,443																											8,443
外壁(塗装)	15	8,860															1,617																									10,477
外壁(アスベスト撤去)	-	20,673																																								20,673
空調(個別式)	15													2,230																												2,230
給排水衛生設備	25	12,900																									13,501															26,401
受変電設備	25			7,358																																						7,358
火災警報設備	15													864																												864
テニスコート人工芝	10											33,475										33,475																				66,949
壁打ち場	-	7,500																																								7,500
グラウンド	-	57,500																																								57,500
更新	65																																		111,888							111,888
合 計		107,433	0	7,358	0	0	0	0	0	0	0	33,475	0	3,094	8,443	0	1,617	0	0	0	0	33,475	0	0	0	0	13,501	0	0	0	0	0	0	111,888	0	0	0	0	0	0	0	320,283

【対策費用算定表】

施 設 番 号	7 - 2
施 設 名	各務原市川島スポーツ公園(附属棟)
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

附属棟：屋外トイレ、ポンプ室、野球場施設

建築年度	1979
構造	RC
法定耐用年数	50年(2029)
目標使用年数	65年(2044)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	151,081千円	3,777千円

(単位：千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
受水槽・高架水槽設備	15													4,840																												4,840
野球場バックネット	30						77,000																																			77,000
井戸ポンプ	15				3,850															4,659																						8,509
更新	65																									60,732																60,732
合 計		0	0	0	3,850	0	77,000	0	0	0	0	0	0	4,840	0	0	0	0	0	4,659	0	0	0	0	0	60,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,081

【対策費用算定表】

施 設 番 号	8
施 設 名	各務原スポーツ広場 等
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	576,200千円	14,405千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20															6,545																											6,545	
外壁(塗装)	15															4,867																											4,867	
空調(個別式)	15												2,230															2,230															4,460	
給排水衛生設備	25																								10,466																		10,466	
受変電設備	25					715	28,750																																				29,465	
火災警報設備	15															897																											897	
受水槽・高架水槽設備	15															4,840																											4,840	
テニスコート人工芝	10	27,665					18,350					44,528	22,264	44,528			22,264			22,264	22,264		22,264	44,528		22,264																	313,183	
防球フェンス	30	10,100																																									10,100	
観覧席	30																																										0	
テニスコートネット支柱	-						2,188																																				2,188	
屋外トイレ(便器洋式化)	-							1,038	14,982																																		16,020	
照明環境ローカルシステム	20						880	26,665																		523	28,490																	56,558
更新	65																																					116,611						116,611
合 計		37,765	0	0	0	715	50,168	27,703	14,982	0	0	44,528	24,494	44,528	0	17,149	22,264	0	0	22,264	22,264	0	22,264	44,528	10,466	523	50,754	2,230	0	0	0	0	0	0	0	0	116,611	0	0	0	0	0	0	576,200



【対策費用算定表】

施 設 番 号	9
施 設 名	各務原市民球場
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	755,273千円	18,882千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
屋上防水	20																								23,432																		23,432	
外壁(塗装)	15				2,079	69,300														69,300																							140,679	
空調(個別式)	15															2,230																											2,230	
給排水衛生設備	25	1,001	13,750																									37,468															52,219	
受変電設備	25					715	30,706																																				31,421	
火災警報設備	15															897																											897	
防球ネット	30			3,047	26,267																																						29,314	
スコアボード	-		1,523					84,293																																			85,816	
外野フェンス等プロテクタ更新	-										4,659																																4,659	
更衣室収納取替	-																																											0
照明設備(非常用)	12				1,484																																						1,484	
グラウンド不陸解消	5						4,510					4,510					4,510				4,510						4,510																22,550	
更新	65																																										360,572	360,572
合 計		1,001	15,273	3,047	29,830	70,015	35,216	84,293	0	0	4,659	4,510	0	0	0	3,127	4,510	0	0	0	69,300	4,510	0	0	23,432	0	4,510	37,468	0	0	0	0	0	0	0	0	360,572	0	0	0	0	0	0	755,273

【対策費用算定表】

施 設 番 号	10
施 設 名	各務原勤労者総合グラウンド
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	50年(2039)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	151,511千円	3,788千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋根(塗装)	7			5,170							1,790							1,790							1,790																		10,540
外壁(塗装)	15													7,167															7,167														14,334
給排水衛生設備	25																									7,526																	7,526
火災警報設備	15																		897																								897
防球フェンス	30		34,334																																								34,334
更新	65																																				83,880						83,880
合 計		0	34,334	5,170	0	0	0	0	0	0	1,790	0	0	7,167	0	0	0	1,790	897	0	0	0	0	0	1,790	7,526	0	0	7,167	0	0	0	0	0	0	83,880	0	0	0	0	0	0	151,511

【対策費用算定表】

施 設 番 号	11
施 設 名	各務原市弓道場
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2020
構造	S
法定耐用年数	34年(2054)
目標使用年数	50年(2070)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	59,993千円	1,500千円

(単位：千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋根(塗装)	10											2,335											2,335											2,335									7,005
外壁(塗装)	15																7,900															7,900											15,800
給排水衛生設備	25																										7,526																7,526
火災警報設備	15																897																897										1,793
防矢ネット	-				3,025																																						3,025
旧施設解体	-		24,844																																								24,844
合 計		0	24,844	0	3,025	0	0	0	0	0	0	2,335	0	0	0	0	8,797	0	0	0	0	0	2,335	0	0	0	7,526	0	0	0	0	8,797	0	2,335	0	0	0	0	0	0	0	0	59,993

【対策費用算定表】

施 設 番 号	12 - 1
施 設 名	各務原市民プール
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1989
構造	RC
法定耐用年数	30年(2019)
目標使用年数	65年(2054)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	5,153,857千円	128,846千円

(単位：千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計			
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41				
屋上防水	20														70,175																												70,175		
外壁(塗装)	15														7066																												7,066		
外壁(アスベスト撤去)	-														50,600																												50,600		
自動制御機器更新工事	15				1,348															1,631																							2,979		
給排水衛生設備	25		45,035																								112,210																157,245		
中央監視設備	15		7,700														25,875																										33,575		
受変電設備	25											312,785																															312,785		
火災警報設備	15											8,833															8,833																	17,666	
浄化槽設備	-	1,769												359,550																													361,319		
受水槽・高架水槽設備	15																			4,840																							4,840		
天井	-	2,492	22,997																																								25,489		
カーテンウォール	30	2,679	27,787																																									30,466	
ろ過機	30	14,849		13,541		1,309	18,018																																					47,717	
温水ポンプ	-	1,440																																										1,440	
屋上防水(プール)	20														10,020																													10,020	
空調(個別式、プール)	15				3,465	152,889	535,905														3,465	152,889	535,905																						1,384,518
給排水衛生設備(プール)	25		1,875																																									1,875	
火災警報設備(プール)	15											897													897																				1,793
屋上防水(機械室)	20																			7,676																								7,676	
外壁(塗装、機械室)	15											11,225													11,225																				22,450
外壁(アスベスト撤去、機械室)	-											39,072																																39,072	
空調(個別式、機械室)	15																								2,230																				2,230
給排水衛生設備(機械室)	25			9,020																								12,274																	21,294
屋上防水(更衣室)	20														15,756																													15,756	
給排水衛生設備(更衣室)	25	512																									25,194																		25,706
屋上防水(食堂)	20																						4,101																					4,101	
外壁(塗装、食堂)	15																						3,208																					3,208	
空調(個別式、食堂)	15											2,230																	2,230																4,460
消火設備	15						1,320																																					1,320	
プール床面(屋外)						22,000	38,000																																					60,000	
プールサイド(屋外)	-	7,920					15,950																																					23,870	
更新	65																																												2,401,146
合 計		31,661	105,394	22,561	4,813	176,198	609,193	0	0	0	0	372,812	2,230	359,550	153,617	0	0	25,875	0	6,471	11,141	152,889	543,214	897	13,455	0	34,027	114,440	12,274	0	0	0	0	0	1,200,573	1,200,573	0	0	0	0	0	0	5,153,857		

○各務原市民プールは施設規模が大きいため、更新(建替え)は2年間で行うこととし、更新(建替え)費用を2年間にわたり均等に配分して計上しています。

【対策費用算定表】

施 設 番 号	12 - 2
施 設 名	各務原市民プール(車庫、倉庫)
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1990
構造	S
法定耐用年数	31年(2021)
目標使用年数	50年(2040)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	112,622千円	2,816千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
更新	50																					112,622																				112,622
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,622

【対策費用算定表】

施 設 番 号	14
施 設 名	各務原市総合運動公園
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2014
構造	RC
法定耐用年数	50年(2064)
目標使用年数	65年(2079)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	1,025,400千円	25,635千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
給排水衛生設備	25																		10,659																							10,659
浄化槽設備	-																			255,000																						255,000
屋外トイレハウス更新	-														133,168																											133,168
陸上競技場	-	5,775				28,380																																				34,155
陸上競技場フィニッシュコーダー	-								9,691																																	9,691
サッカー人工芝	10														247,124										167,802									167,802								582,728
維持管理費用																																										0
保守点検費用																																										0
合 計		5,775	0	0	0	28,380	0	0	9,691	0	0	0	0	0	380,292	0	0	0	10,659	255,000	0	0	0	0	167,802	0	0	0	0	0	0	0	0	167,802	0	0	0	0	0	0	0	1,025,400

【対策費用算定表】

施 設 番 号	13
施 設 名	各務原市空の森運動公園
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2011
構造	RC
法定耐用年数	50年(2061)
目標使用年数	65年(2076)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	18,025千円	451千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計	
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41		
屋上防水	20													505																				505									1,010
屋根(瓦)	20													2,428																				2,428									4,856
外壁(塗装)	15								3,784															3,784														3,784					11,351
給排水衛生設備	25																		808																				3,784				808
合 計		0	0	0	0	0	0	0	3,784	0	0	0	0	2,933	0	0	0	0	808	0	0	0	0	3,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933	0	0	0	0	3,784	0	0		18,025

【対策費用算定表】

施 設 番 号	15
施 設 名	各務原市ホッケー場
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	2005
構造	-
法定耐用年数	-
目標使用年数	-

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	661,260千円	16,532千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
照明設備	-										31,491																															31,491
人工芝	10									139,755									139,755										139,755											139,755		559,020
防球フェンス	30																70,749																									70,749
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,755	31,491	0	0	0	0	0	70,749	0	0	139,755	0	0	0	0	0	0	0	0	139,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,755	0	661,260



【対策費用算定表】

施 設 番 号	16
施 設 名	協定グラウンド
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1967
構造	RC
法定耐用年数	50年(2017)
目標使用年数	65年(2032)

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	26,547千円	664千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41	
防球フェンス	30			15,031																																						15,031
更新	65													11,516																												11,516
合 計		0	0	15,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,547

【対策費用算定表】

施 設 番 号	17
施 設 名	各務原市飛鳥球場
担 当 部 課	教育委員会事務局スポーツ課

建築年度	1981
構造	-
法定耐用年数	-
目標使用年数	-

計画期間	計画期間中に要する費用	1年あたり費用
40年	40,531千円	1,013千円

(単位:千円)

	耐用 年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	合計		
		R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36	R37	R38	R39	R40	R41			
外野フェンス	30		16,578																														10,339										26,917	
連絡橋	-					946																																					946	
グラウンド	30		7,802																															4,865										12,667
合 計		0	24,380	0	0	946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,531	
